




Bouwtijdlijn KempíQ modelwoning

Weken:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Start bouw

Grondwerk
Fundering en begane grondvloer
Binnenwanden en steigerbouw
Verdiepingsvloer, wanden 1e verd.
Kozijnen stellen en plaatsen kap
Plaatsen dakkapel en isoleren
Uitvullen plafonds
E&W-installatie
Metselwerk
Vorbereidingen stucwerk
Leggen dakpannen
Stucwerk
Zinkwerk dakgoten
Dekvloeren en steiger demonteren
Tegel- en voegwerk
Deuren afhangen, E&W afmonteren
Spuitwerk plafonds
Vloerafwerking
Diverse aftimmerwerkzaamheden
Oplevering

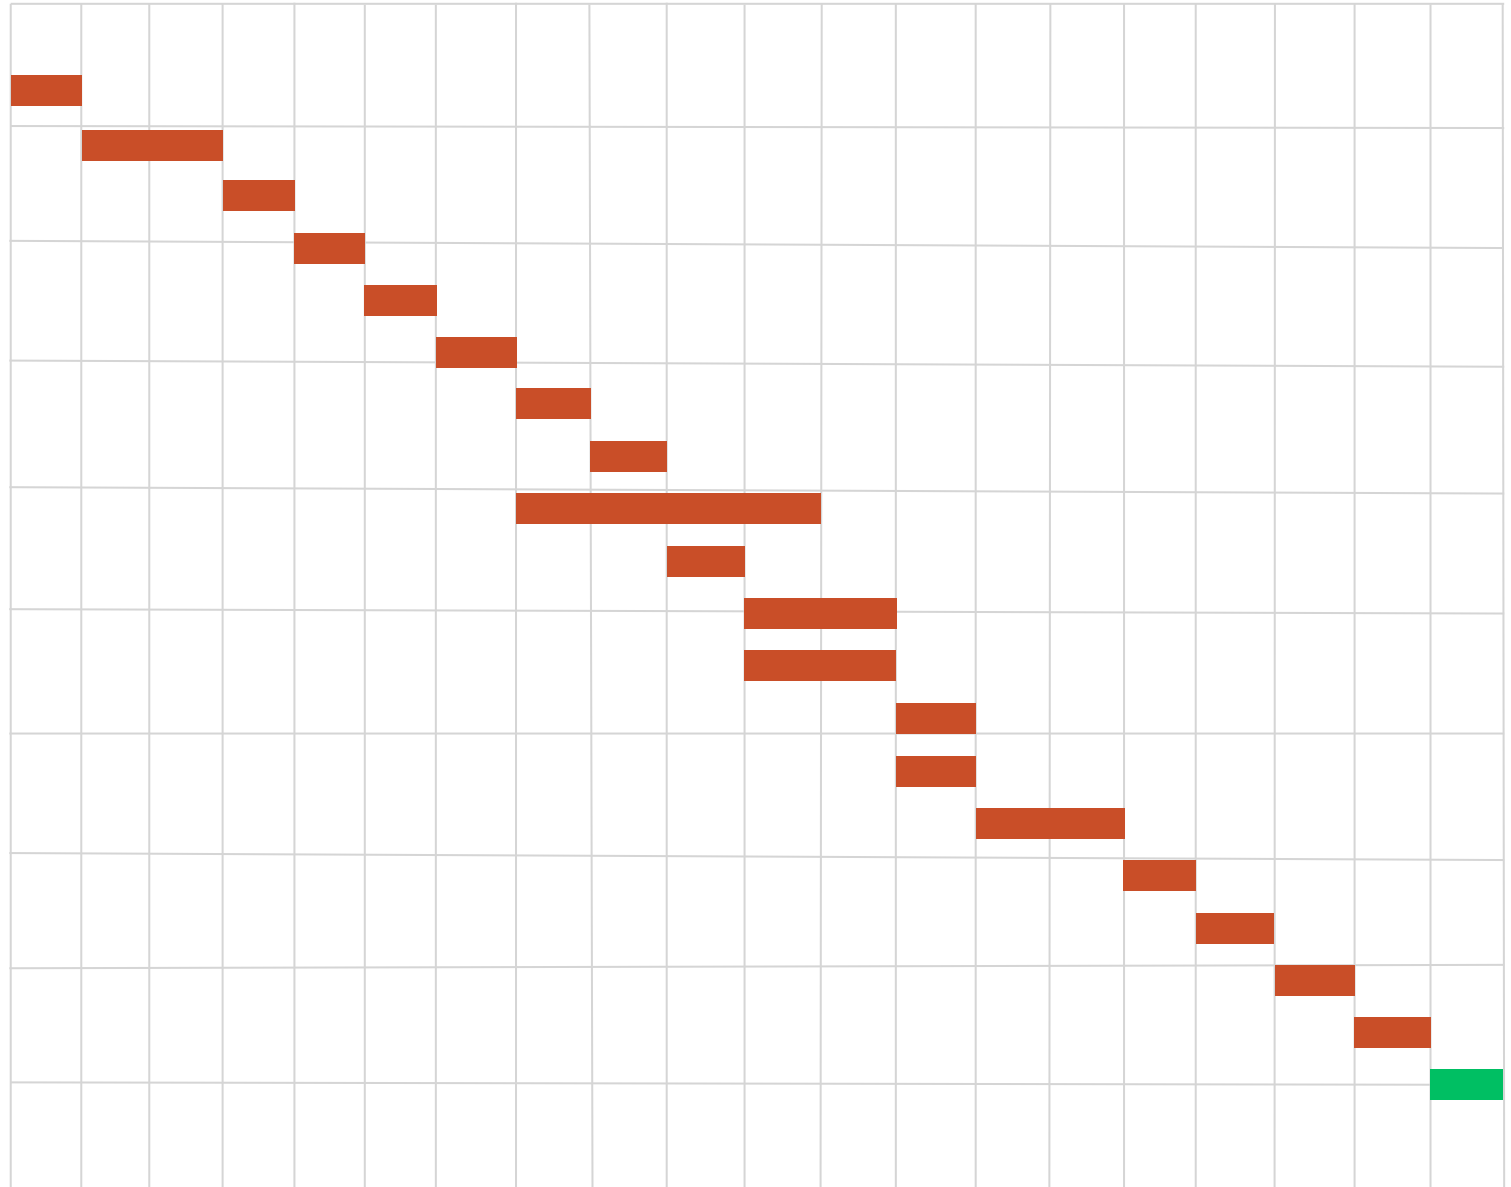

*Genoemde tijdlijn is vanaf start bouw, de duur van de voorbereiding is mede afhankelijk van externe factoren *Genoemde weken zijn indicatief en kunnen afwijken per model
